


PIXEL HIGH LLC.

データセンター事業の進行状況について

全体像と進行状況

◇福島県大熊町コンテナデータセンター構築の全体像

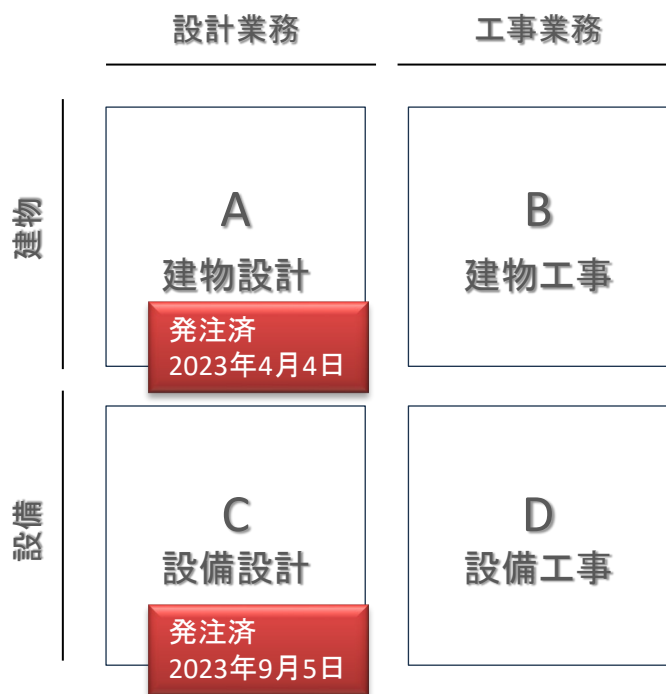

■DC構築の業務分類 (経済産業省の補助事業の観点より)

- A) 建物設計業務
 - B) 建物工事業務
 - C) 設備設計業務
 - D) 設備工事業務
- 経済産業省の補助事業の観点において、補助対象経費となるデータセンターの「建物」および「設備」について、左記の切り分けに従い各業務単位で計画の確定を行い、経産省より承認を経て、発注を進めております。

現在のステータス

承認・発注済み・・・A、C

未承認・未発注・・・B、D

今後につきましてはA、Cの建物・設備の設計業務及び建築確認申請を行い、申請許可が下りた後に、B建物工事、D設備工事を順次行って参ります。事業開始時期につきましては2023年1月19日に公表している通り2024年夏頃を予定しております。

事業準備の状況について

◇DC事業の本稼働へ向けた準備

主な領域	現在の準備状況
通信	通信回線事業者および他社データセンター(中継用)と協議中。 例)大手通信事業者、近隣DC事業者 他
電気	安定稼働すべき主力設備(サーバー、冷却設備)の電力容量等を設計作業中。 電気小売事業者および電気配電事業者へ申請予定。 例)主要電力小売事業者、送配電事業者 他
運営/システム	稼働後の運営体制の構築および管理システム(顧客向け&管理用)の開発について、自社エンジニアと外部パートナー企業が協議しながら準備中。セキュリティ対策含む。 例)スーパーマイクロ社、NVIDIA社 他
営業	AI・HPC向けのGPUをベアメタルクラウドサービスにて企画開発中。自社営業に限らず販売パートナーも準備中。 例)クラウドサービス事業者 他
